


Viikko 50 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Ensimmäisen kerroksen kiiltohiottavasta betonilattiasta valmistui tällä viikolla ruokalan osuus, eli noin puolet. Toinen puolisko tästä lattiasta valmistuu ensi viikon aikana. Lattian suojauksen jälkeen ruokalassa ryhdytään seuraavaksi tekemään alakattorunkoa.

Kiintokalustus sekä sisäovien- ja ikkunoiden asennus jatkuu toisessa kerroksessa ensi viikolla.

Talotekniikan töitä tehdään tällä hetkellä lähinnä 1. kerroksen teknisen käsityön tiloissa, johon odotetaan saapuvaksi kalusteet, työkalut ja koneet alkuvuodesta 2025.

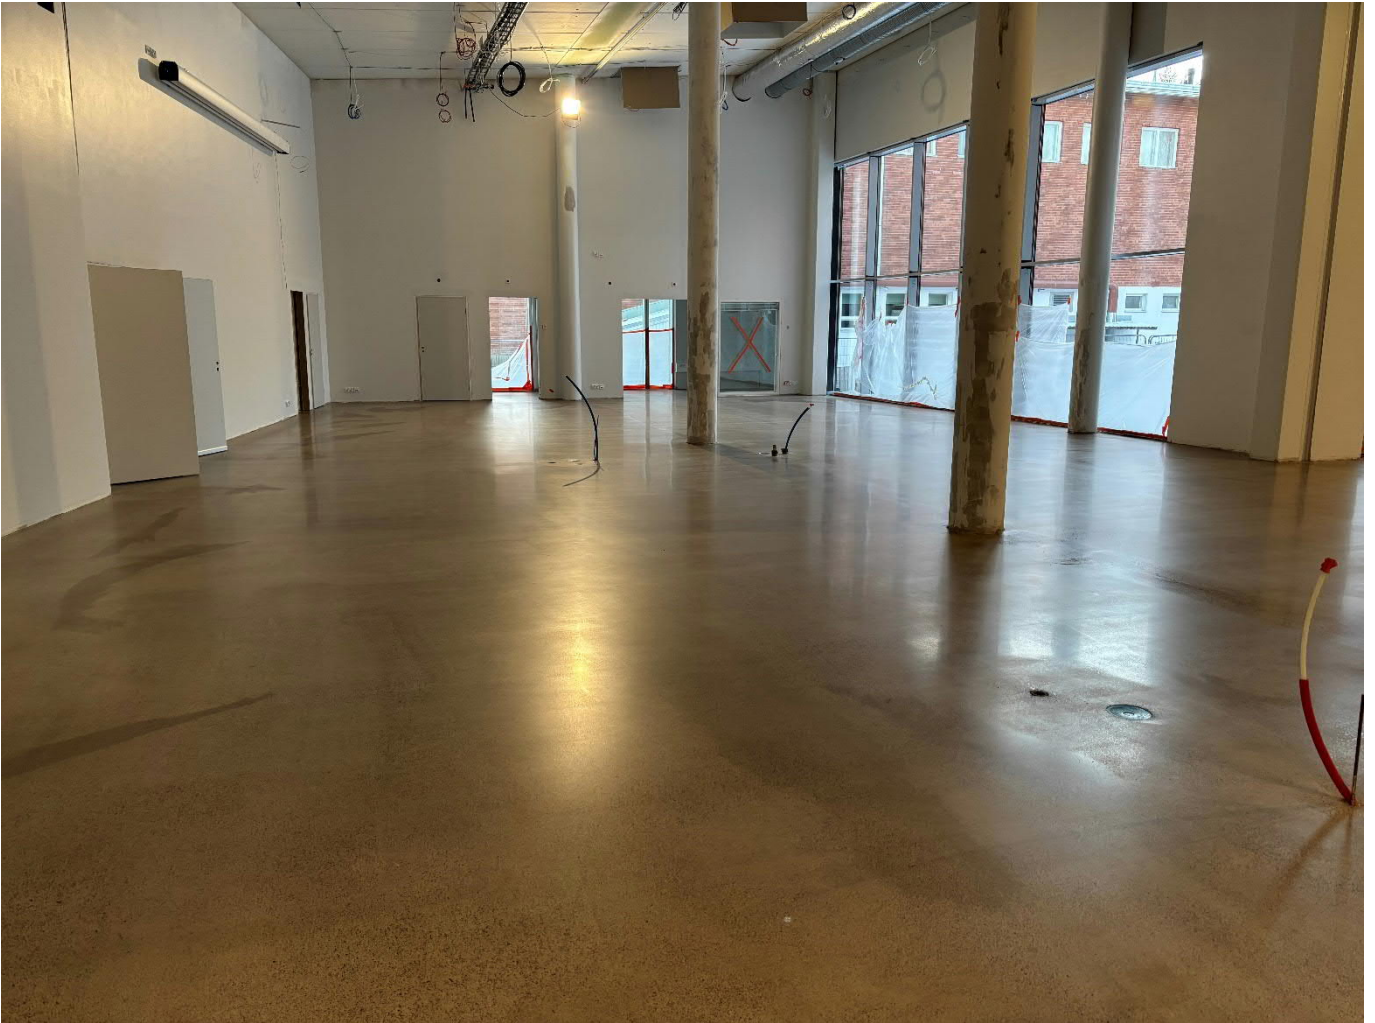

Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy
